

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Pemkab. Way Kanan Km. 02 Blambangan Umpu

BERITA ACARA PRESTASI PEKERJAAN
Nomor : 600/ 154 /BAPP/IV.08-WK/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama : **M. AL. SIDIQ**
Jabatan : **Direktur** **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**
Alamat : **Jl. Mawar Indah RT.002 RW.02 Labuhan Dalam Tanjung**
Senang Bandar Lampung
Selaku Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor
2. Nama : **A. HAIRUL UMAR,ST.**
Jabatan : **Supervision Engineer** **CV. VIEW CONSULTANT**
Alamat : **Bandar Lampung**
3. Nama : **Ir. HANIF SYAHRONI,S.T.**
Jabatan : **Koordinator Pengawas Lapangan Dinas PUPR**
Alamat : **Komplek Perkantoran Pemkab. Way Kanan Km. 02 Blambangan Umpu - Way Kanan**

Dengan ini menyatakan

1. Kedua belah Pihak setuju dan sepakat bahwa;
Pekerjaan : **01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik**

No./Tgl Kontrak : **K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 20 Mei 2024**
Nilai Kontrak : **Rp 16.985.933.300**
2. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut di atas Kontraktor telah menyelesaikan segala kewajiban dan pekerjaan dengan prestasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat bulanan/ mouthly certificate 69,82% terlampir
3. Kontraktor berhak menerima pembayaran sebesar 69,82% dari nilai kontrak sebagaimana kemajuan/ prestasi kerja yang telah dicapai seperti terurai dalam dokumen pendukung (terlampir) dengan potongan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pembayaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	M. AL. SIDIQ	PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO	 PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
2.	A. HAIRUL UMAR,ST.	Supervision Engineer	 2.
3.	Ir. HANIF SYAHRONI,S.T.	Koordinator Pengawas Lapangan Dinas PUPR	 3.

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)


Ir. SEPTAMA PUTRA,ST.,MT.
NIP.19840901 201001 1 010

MONTHLY CERTIFICATE

MC 9 (Sembilan)

TANGGAL : 29 October 2024 S/D 16 November 2024

PEKERJAAN :

01 PENINGKATAN JALAN SP. ANDALAS - TALANG PLASTIK

KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

NILAI KONTRAK : Rp.16.985.933.300,00

NO. KONTRAK : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

TANGGAL KONTRAK : 16 April 2024

ADDENDUM KONTRAK : ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

TANGGAL ADDENDUM KONTRAK : 21 May 2024

ADDENDUM KONTRAK : ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

TANGGAL ADDENDUM KONTRAK : 11 October 2024

MASA KONTRAK : 220 (DUA RATUS DUA PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

Alamat : Jl. Mawar Indah RT. 002 RW. 02 Labuhan Dalam Tanjung Seneng Bandar Lampung



ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO, PT



SERTIFIKAT BULANAN NO.

Propinsi : Lampung
Kabupaten : Way Kanan
Kegiatan : -
Pekerjaan : 01 Peningkatan Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
Lokasi : Kecamatan Blambangan Umpu
Penyedia Jasa Konstruksi : PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
Konsultan Supervisi : CV. VIEW CONSULTANT
No.Kontrak : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal Kontrak : 16 April 2024
No.Addendum Kontrak : ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal Add kontrak : 21 Mei 2024
No.Addendum Kontrak : ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal Add kontrak : 11 Oktober 2024
Nilai Kontrak : Rp 16,985,933,300

SERTIFIKAT BULANAN NO : Mc 9 (Sembilan)
BULAN : 8 (Delapan)
TANGGAL : 29 October 2024 s.d 16 November 2024

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp.)	PELAKSANAAN PEKERJAAN	
			NILAI PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp)	NILAI PRESTASI S/D SAAT INI (%)
I	DIVISI 1.UMUM	243,147,480.00	243,147,480.00	1.59
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	318,044,519.38	529,044,410.61	3.46
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR	2,207,201,411.08	2,730,019,662.08	17.84
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	12,167,437,652.96	10,769,191,769.94	70.37
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	259,990,236.8	935,964,852.37	6.12
IX	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	106,821,317.1	95,274,442.27	0.62
				-
				-
				-
		15,302,642,613.00	15,302,642,613.00	100.00
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan		15,302,642,613.00	100.00
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		1,683,290,687.43	
(C)	Jumlah Harga Pekerjaan + PPN (11 %)		16,985,933,300.43	
(D)	Jumlah Harga Pekerjaan Dibulatkan		16,985,933,300.00	
(E)	Material Dilapangan			
(F)	Jumlah Kotor Sertifikat Bulan Ini		16,985,933,300.00	
(G)	POTONGAN - POTONGAN :			
	a. Nilai Sertifikat s/d Bulan Lalu		8,894,720,553.00	
	b. Pengembalian Uang Muka 20% X (F)		3,397,186,660.00	
	c. Retensi 5 % x (F)		849,296,665.00	
	d. Denda			
	Jumlah Potongan = (a + b + c + d)		13,141,203,878.00	
(H)	NILAI SERTIFIKAT BULAN INI (SUDAH TERMASUK PAJAK) = (F) - (G)		3,844,729,422.00	

TERBILANG :

Tiga Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah

KEMAJUAN PEKERJAAN (%)	100.00%	PROSENTASE S/D BULAN INI	100.00	%
		PROSENTASE S/D BULAN LALU	-	%
		PROSENTASE BULAN INI	100.00	%

MENGETAHUI
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan


Ir. SEPTAMA PUTRA, ST, MT
NIP. 19840901 201001 1 010

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN SUPERVISI
CV. VIEW CONSULTANT

A. HAIRUL UMAR, ST
Supervision Engineer

DIBUAT OLEH,
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
DIREKTUR



NO. SERTIFIKAT : Mc 9 (Semblan)
TANGGAL : 16 November 2024
PERIODE : 29 October 2024 s.d 16 November 2024

Propinsi : Lampung
Kabupaten : Way Kanan
Kegiatan : 01 Perencanaan Jalan Sp. Andalas - Taliang Plastik
Pekerjaan : Kecamatan Blambangan Umpu
Lokasi : PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSIINDO
Penyedia Jasa Konstruksi : CV. VIEW CONSULTANT
Konsultansi Supervisi : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
No. Kontrak : 16 April 2024
Tanggal Kontrak : ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
No. Addendum Kontrak : 21 May 2024
Tanggal Add kontrak : ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
No. Addendum Kontrak : 11 October 2024
Tanggal Add kontrak :

VII	DIVISI 7. STRUKTUR	URAIAN	SATUAN	KONTRAK / ADDENDUM			REALISASI VOLUME			JUMLAH HARGA		
				HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME	TOTAL HARGA (Rp.)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S/D BULAN INI (Rp.)
				4	5	6=(4X5)	7	8	9=(7+8)	10=(4X7)	11=(4X8)	12=(10+11)
1			M3	2.079.921,89	450,00	935.964.852,37	450,00	-	450,00	935.964.852,37	-	935.964.852,37
7.1 (g)		Beton, f'c 15 Mpa										
TOTAL												
												935.964.852,37

DIPERIKSA

KONSULTAN SUPERVISI
CV. VIEW CONSULTANT


A. MAIBUL UMAR, ST
Supervision Engineer

DIBUAT

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSIINDO


PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSIINDO
DIREKTUR

DISETUIJ

Sub Koordinator Teknis Jalan Dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan


I. ROSHAN, ST
NIP. 19770525 201101 1 003



NO. SERTIFIKAT : MC 5 (Sembilan)
TANGGAL : 16 November 2024
PERIODE : 29 October 2024 s.d 16 November 2024

Propinsi : Lampung
Kabupaten : Way Kanan
Kecamatan : Kecamatan Blambangan Umpu
Lokasi : PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSIINDO
Penyedia Jasa Konstruksi : CV. VIEW CONSULTANT
Konsultan Supervisi : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
No. Addendum Kontrak : 16 April 2024
Tanggal Add Kontrak : ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
No. Addendum Kontrak : 21 May 2024
Tanggal Add Kontrak : ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal Add Kontrak : 11 October 2024

VI	DIYISI 6. PERKERASAN ASPAL	SATUAN	KONTRAK / ADDENDUM			REALISASI VOLUME			JUMLAH HARGA		
			HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME	TOTAL HARGA (Rp.)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S/D BULAN INI (Rp.)
1	2	3	4	5	6=(4 X 5)	7	8	9=(7+8)	10=(4X7)	11=(4X8)	12=(10+11)
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Emulsi	Lt	23.711,26	13.659,59	323.886.039,57	13.659,59	-	13.659,59	323.886.039,57	-	323.886.039,57
6.1 (2a)	Lapis Perkeras - Aspal Cair Emulsi	Lt	22.095,58	5.023,46	110.996.237,86	958,33	4.065,13	5.023,46	21.174.831,22	89.821.406,63	110.996.237,86
6.3 (2b)	Lapis Perkeras - Aspal Cair Emulsi	M3	2.722.783,51	1.824,52	4.967.773.890,81	348,07	1.478,46	1.824,52	947.705.757,57	4.020.068.133,24	4.967.773.890,81
6.3 (2c)	Lapis Perkeras - Aspal Cair Emulsi	M3	2.493.854,84	2.150,18	5.366.535.601,71	2.150,18	-	2.150,18	5.366.535.601,71	-	5.366.535.601,71
TOTAL										18,769,191,769,94	

Sub Koordinator Teknis Jalan Dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan


NIP. 19770525 201101 1 003

DIPERIKSA
KONSULTAN SUPERVISI
CV. VIEW CONSULTANT

A. HAIRUL IMAR, ST
Supervision Engineer

DIBUAT
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSIINDO

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSIINDO
DIREKTUR



NO. SERTIFIKAT	: Mc 9 (Sembilan)
TANGGAL	: 16 November 2024
PERIODE	: 29 October 2024 s.d 16 November 2024

Propinsi	: Lampung
Kabupaten	: Way Kanan
Kegiatan	: -
Pekerjaan	: 01. Peningkatan Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
Lokasi	: PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
Penerima Jasa Konstruksi	: CV. VIEV CONSULTANT
Konsultan Supervisi	: K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WW/2024
No.Kontrak	: 16 April 2024
Tanggal Kontrak	: ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.06-WW/2024
No.Addendum Kontrak	: 21 May 2024
Tanggal Add kontrak	: ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WW/2024
No.Addendum Kontrak	: 11 October 2024

[illegible]

NO. SERTIFIKAT : Mc 9 (Sembilan)
TANGGAL : 16 November 2024
PERIODE : 29 October 2024 s.d 16 November 2024

Propinsi : Lampung
Kabupaten : Way Kanan
Kecamatan : Kecamatan Blambangan Umpu
Lokasi : PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSI
Penerima Jasa Konstruksi : CV. VIEW CONSULTANT
Konsultan Supervisi : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV-08-WK/2024
No. Kontrak : ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV-08-WK/2024
Tanggal Add kontrak : 21 May 2024
No. Addendum kontrak : ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV-08-WK/2024
Tanggal Add kontrak : 11 October 2024

III DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
NO MATA PEMBAKARAN	URAIAN	SATUAN	KONTRAK / ADDENDUM			REALISASI VOLUME				
			HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME	TOTAL HARGA (Rp.)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)
1	2	3	4	5	6=(4X5)	7	8	9=(7+8)	10=(6X7)	11=(6X8)
3.1.(1)	Galian Benda	M3	104.871,58	1.064,49	111.634.490,84	1.064,49	-	1.064,49	111.634.490,84	-
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	M3	139.168,76	681,41	94.830.859,15	681,41	-	681,41	94.830.859,15	-
3.2.(1b)	Timbunan Benda dari hasil galian	M3	411.195,31	658,50	270.772.111,08	658,50	-	658,50	270.772.111,08	-
3.3.(1)	Penyediaan Badan Jalan	M2	2.000,25	24.904,24	51.806.949,53	24.904,24	-	24.904,24	51.806.949,53	-
TOTAL						529.044.410,61				

DISETUI

DIPERIKSA

DIBUAT

Sub Koordinator Teknis Jalan Dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan

KONSULTAN SUPERVISI
CV. VIEW CONSULTANT

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSI

NIP. 19770525 201101 1 003

A. WAHYU UMAR, ST
Supervision Engineer

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSI
DIREKTUR



NO. SERTIFIKAT	: Mc 9 (Sembilan)
TANGGAL	: 16 November 2024
PERIODE	: 29 October 2024 s.d 16 November 2024

Propinsi	: Lampung
Kabupaten	: Way Kanan
Kepolisian	: -
Pekerjaan	: -
Lokasi	: 01 Peningkatan Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
	: Kecamatan Blambangan Umpu
Penyedia Jasa Konstruksi	: PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
Konsultan Supervisi	: CV. VIEW CONSULTANT
No. Kontrak	: K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WW/2024
Tanggal Kontrak	: 16 April 2024
No. Addendum Kontrak	: ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WW/2024
Tanggal Add kontrak	: 21 May 2024
No. Addendum Kontrak	: ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WW/2024
Tanggal Add kontrak	: 11 October 2024

[illegible]

LAPORAN

KEMAJUAN PEKERJAAN BULAN KE 8 (Delapan)

TANGGAL : 29 October 2024 S/D 16 November 2024

PEKERJAAN :

01 PENINGKATAN JALAN SP. ANDALAS - TALANG PLASTIK
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

NILAI KONTRAK : Rp.16.985.933.300,00

NO. KONTRAK : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

TANGGAL KONTRAK : 16 April 2024

ADDENDUM KONTRAK : ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

TANGGAL ADDENDUM KONTRAK : 21 May 2024

ADDENDUM KONTRAK : ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

TANGGAL ADDENDUM KONTRAK : 11 October 2024

MASA KONTRAK : 180(SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

Alamat : Jl. Mawar Indah RT. 002 RW. 02 Labuhan Dalam Tanjung Seneng Bandar Lampung

PT. ALVIN AKBAR KONTIRUKSINDO
 Konsultan Supervisi
 No. Kontak :
 Tanggal Kontak :
 No. Addendum Kontak :
 Tanggal Add Kontak :
 No. Addendum Kontak :
 Tanggal Add Kontak :
 11 Oktober 2024

PT. ALVIN AKBAR KONTIRUKSINDO
 CV VIEW CONSULTANT
 K-002/SP-BMAREDO-DAMV/08-WV/2024
 16 April 2024
 ADD-01K-002/SP-BMAREDO-DAMV/08-WV/2024
 21 Mei 2024
 ADD-02K-002/SP-BMAREDO-DAMV/08-WV/2024
 11 Oktober 2024

NO. DATA PERUBAHAN	URAIAN	SATUAN	VOLUME / Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES VOLUME						PERSENTASE %	
							SO BULAN LAJU	BULAN IN	SO BULAN IN	SO BULAN LAJU	BULAN IN	SO BULAN IN	SO BULAN IN	PERSENTASE %
A	DIVISI 1. LULUH													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	87.535.000,00	87.535.000,00	0,57	0,67	0,33	1,00	0,33	0,33	0,57	0,57	
1.8 (1)	Mengurangi dan Menambahkan Luluh Lainnya	Ls	1.00	40.441.460,00	40.441.460,00	0,26	0,76	0,24	1,00	0,26	0,26	0,26	0,26	
1.19	Keterbatasan dan Keterbatasan Lainnya	Ls	1,00	115.171.000,00	115.171.000,00	0,75	0,76	0,24	1,00	0,57	0,57	0,57	0,57	
	Jumlah Divisi 1				243.147.460,00	1,58								
B	DIVISI 2. PERKERJAAN TANAH DAN GEOSINTEK													
3.1 (1)	Galian Bata	M3	1.064,49	104.871,56	111.634.490,94	0,73	1.064,49	-	-	0,73	-	0,73	-	
3.1 (8)	Galian Pemasangan Injeksi	M3	661,41	139.168,78	94.830.659,15	0,62	661,41	-	-	0,62	-	0,62	-	
3.2 (8)	Tekstur Bata dan Hasil galian	M3	653,50	411.955,31	270.772.111,08	1,77	653,50	-	-	1,77	-	1,77	-	
3.3 (1)	Pemecahan Bata, Lahan	M2	24.804,24	2.080,25	51.606.948,53	0,34	24.804,24	-	-	0,34	-	0,34	-	
	Jumlah Divisi 2				623.044.410,61	3,46								
C	DIVISI 3. PERKERJAAN BERBURIT													
5.1 (1)	Lapis Persegi Agregat Kelas A	M3	2.934,12	731.701,91	2.133.462.650,27	14,27	2.934,12	-	-	14,27	-	14,27	-	
5.1 (2)	Lapis Persegi Agregat Kelas B	M3	788,94	634.511,33	546.537.011,81	3,57	788,94	-	-	3,57	-	3,57	-	
	Jumlah Divisi 3				2.730.019.662,08	17,84								
D	DIVISI 4. PERKERJAAN ASPAL													
6.1 (1)	Lapis Persegi Persegi, Aspal Cair/Emulsi	Lr	10.659,59	23.111,26	222.865.039,57	2,12	13.669,59	-	-	2,12	-	2,12	-	
6.1 (2)	Lapis Persegi, Aspal Cair/Emulsi	Lr	5.023,46	22.095,36	110.986.237,86	0,73	5.023,46	-	-	0,73	-	0,73	-	
6.3 (5a)	Lapis Persegi, Aspal Cair/Emulsi	M3	1.824,52	2.172.783,51	4.961.773.890,81	32,46	348,07	1.478,46	1.824,52	6,19	28,27	32,46	32,46	
6.3 (5b)	Lapis Persegi, Aspal Cair/Emulsi	M3	2.150,18	2.485.654,84	5.366.535.607,71	35,07	2.150,18	-	-	35,07	-	35,07	-	
	Jumlah Divisi 4				10.768.191.789,94	70,37								
E	DIVISI 5. STRUKTUR													
7.1 (6)	Beton C-15/M3	M3	450,00	2.075.621,39	935.564.612,37	6,12	450,00	-	-	6,12	-	6,12	-	
	Jumlah Divisi 5				935.564.612,37	6,12								
F	DIVISI 6. PERKERJAAN HARAPAN & PERKERJAAN LAIN-LAIN													
9.2 (1)	Maka Jalan Tempasuk	M3	382,55	249.052,89	95.274.442,27	0,62	-	382,55	382,55	-	0,62	0,62	0,62	
	Jumlah Divisi 6				95.274.442,27	0,62								
JUMLAH DIVISI 1 + 3 + 6					15.302.642.617,28	100,00								
JUMLAH TOTAL + PPN 11 %					1.683.280.687,90									
JUMLAH TOTAL DIBAYARKAN					16.985.923.305,18									


Disetujui
 Sup. Koordinator Teknik Jalan Dan Jembatan
 Dina P. Wijaya Umam & Pemasahan Ritung
 Kabupaten Way Kanan
 11 Oktober 2024
 16.985.923.305,18

DIPAERIKSA OLEH
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV VIEW CONSULTANT
 A. HARUL UMAR, ST
 Supervision Engineer

Disetujui
 PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
 PT. ALVIN AKBAR KONTIRUKSINDO
 DOKTER
 11 Oktober 2024


**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan SP. Andalas -
TALANG PLASTIK KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU**

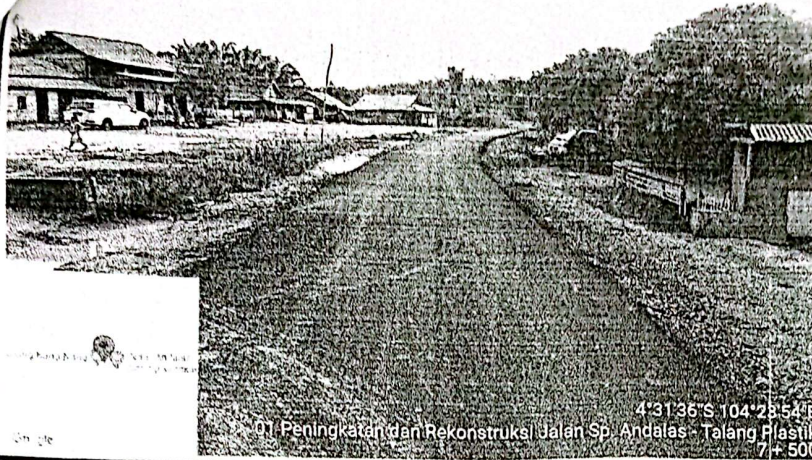


**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 500
100%**

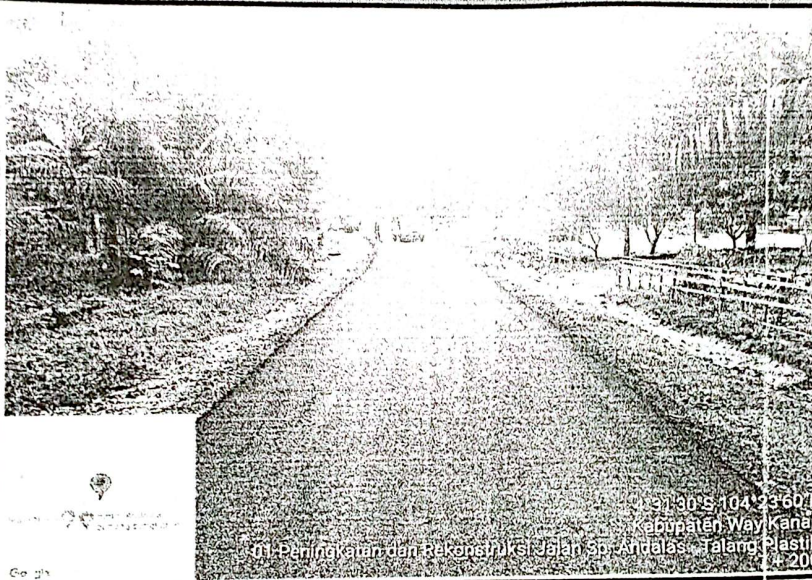

**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 200
100%**

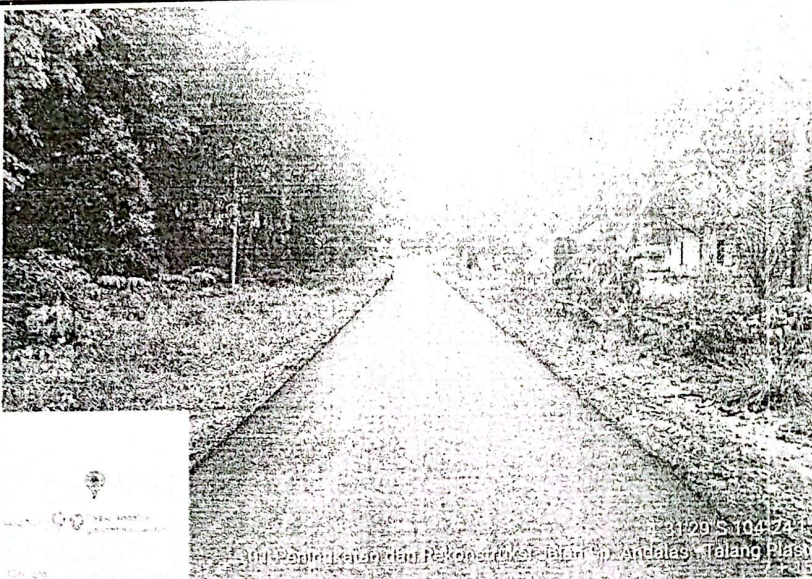

**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 150
100%**

**01 PENINGKATAN DAN REKONSTRUKSI JALAN SP. ANDALAS - TALANG PLASTIK KECAMATAN
BLAMBANGAN UMPU**

Pemerintah Kabupaten Way Kanan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -
Talang Plastik Kecamatan Blambangan Umpu




**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 650
100%**



**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 600
100%**

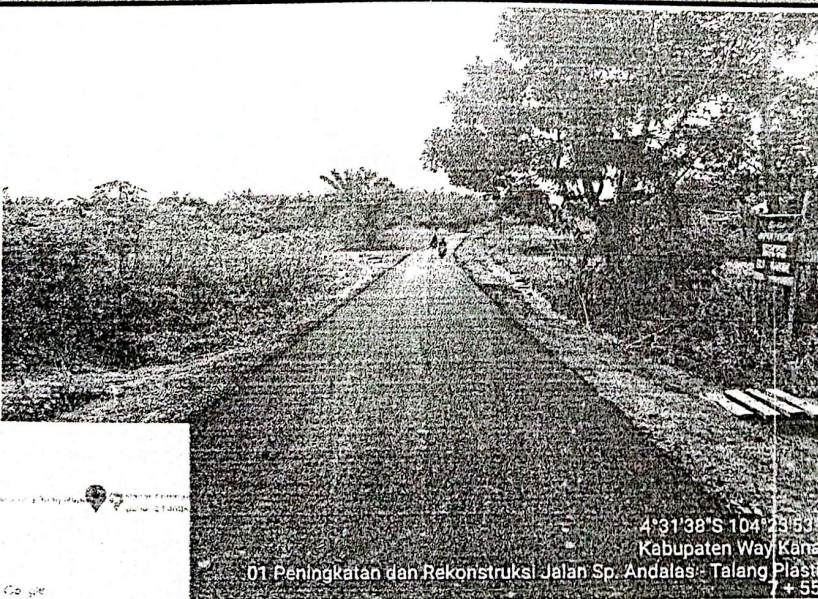


**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 550
100%**

**01 PENINGKATAN DAN REKONSTRUKSI JALAN SP. ANDALAS - TALANG PLASTIK KECAMATAN
BLAMBANGAN UMPU**


PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

01 PENINGKATAN DAN REKONSTRUKSI JALAN SP. ANDALAS -
TALANG PLASTIK KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

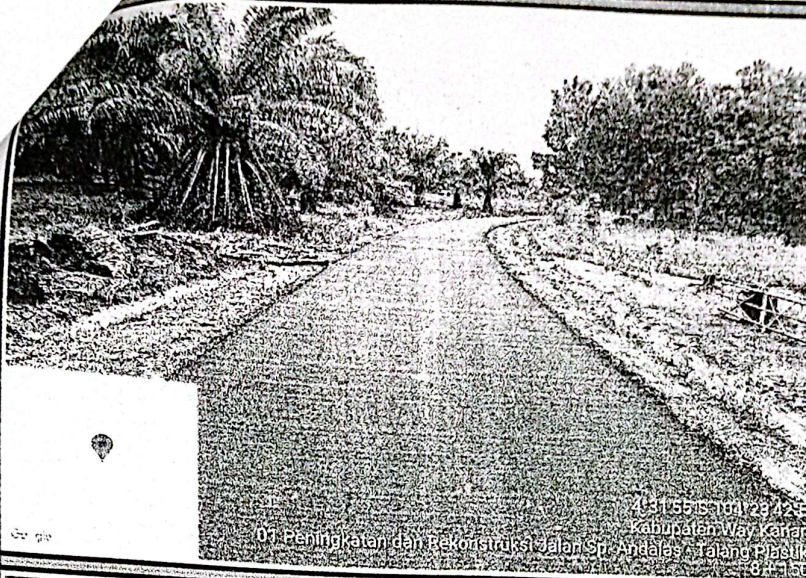


PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO

PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 8 + 150
100%

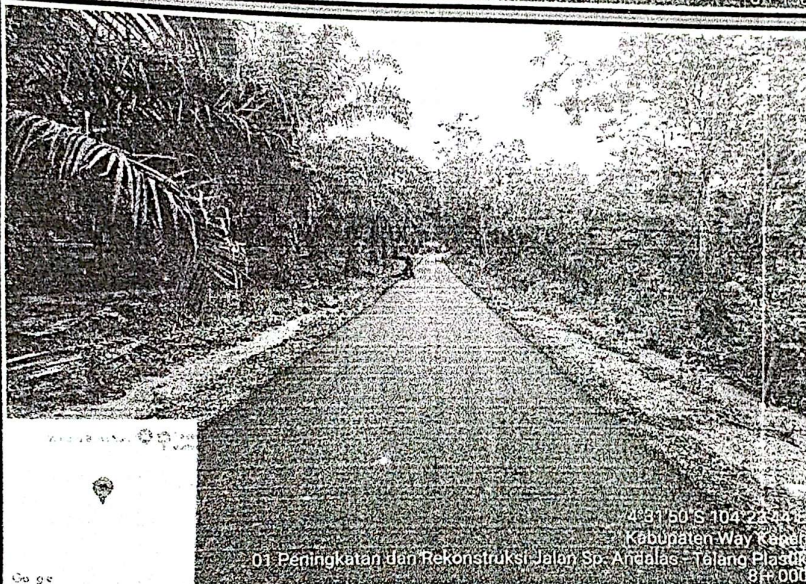

PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO
PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 8 + 000
100%

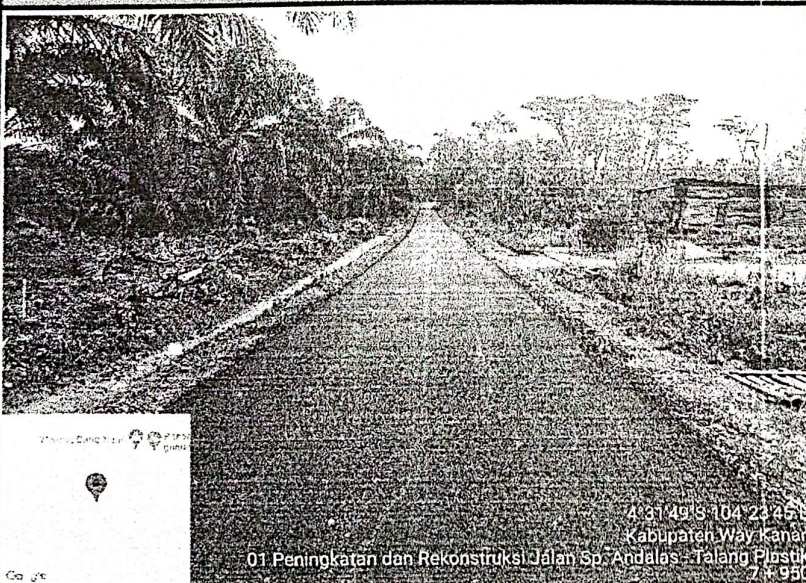

PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO
PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 950
100%

01 PENINGKATAN DAN REKONSTRUKSI JALAN SP. ANDALAS - TALANG PLASTIK KECAMATAN
BLAMBANGAN UMPU

**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**01 PENINGKATAN DAN REKONSTRUKSI JALAN SP. ANDALAS -
TALANG PLASTIK KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU**




**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 800
100%**



**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 750
100%**

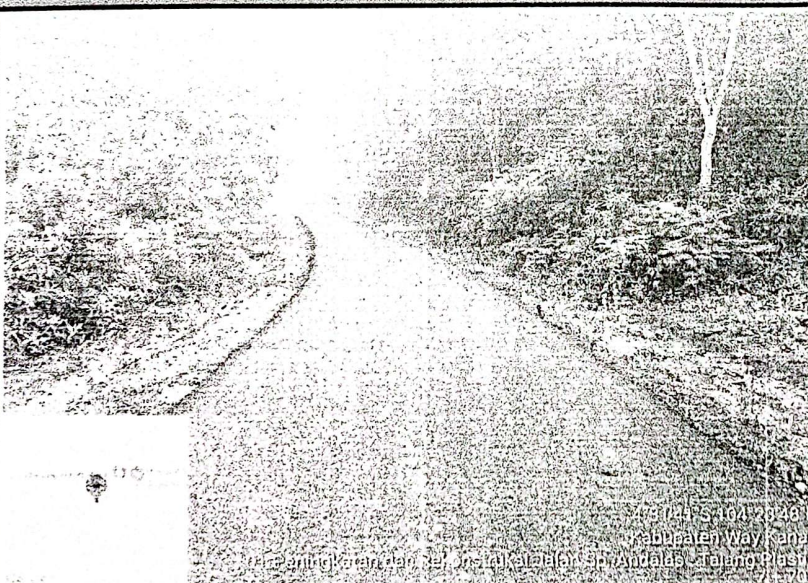

**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 700
100%**

**01 PENINGKATAN DAN REKONSTRUKSI JALAN SP. ANDALAS - TALANG PLASTIK KECAMATAN
BLAMBANGAN UMPU**

**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**


**DOKUMENTASI 01 PENINGKATAN DAN REKONSTRUKSI JALAN SP. ANDALAS -
TALANG PLASTIK KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU**



**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 900
100%**

4°31'47"S 104°23'46"E
01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
7 + 900

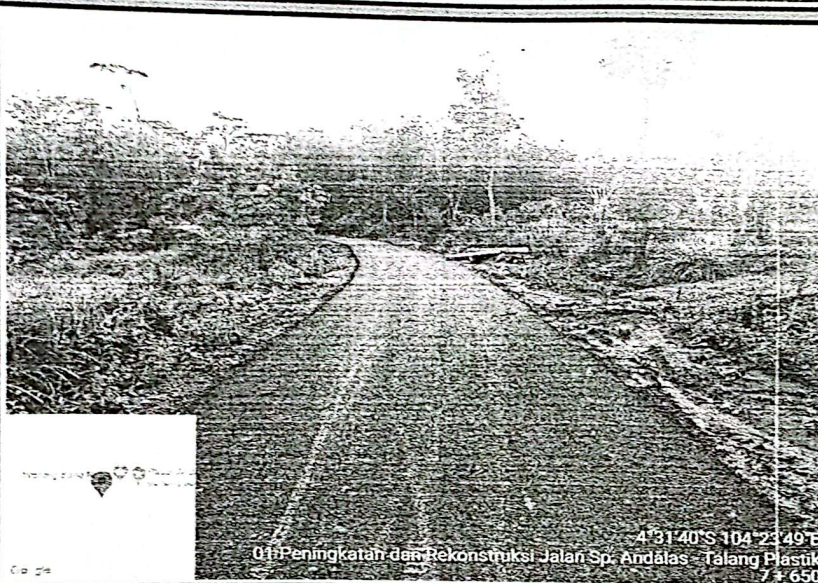

**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 650
100%**

4°31'40"S 104°23'49"E
01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
7 + 650



**PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO**

**PEKERJAAN AC-BC / AC-WC
STA 7 + 850
100%**

4°31'46"S 104°23'46"E
Kabupaten Way Kanan
01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
7 + 850

**01 PENINGKATAN DAN REKONSTRUKSI JALAN SP. ANDALAS - TALANG PLASTIK KECAMATAN
BLAMBANGAN UMPU**
